

2012/10/10

各位

関西岩場環境整備ネット
西村 良信

山神社左岩の終了点整備計画のお知らせ

謹啓 皆様方にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

近年、山神社左岩において、利用者の増加と関連があると思われませんが、終了点のリボルト（改修）の依頼が複数届いています。また JFA から同様の問合せがありますとの連絡もあり、今回終了点の改修を中心にリボルトを行いたいと考えています。（ルートの中間支点は基本現状通り。ただし、腐食等のあるものは一部取り替え予定。）


改修案をご提示しますのでご確認、またご意見等ございましたら下記連絡先にご連絡をお願いします。

記

1. 作業日時（予定）：2012年10月27日（土）
2. 作業者：関西岩場環境整備ネットメンバー及びリボルト経験者
3. 作業内容：山神社左岩の終了点 約17箇所の改修+腐食等のある中間支点若干
4. 使用資材：Fixe #037 #040
ケミカルアンカー HILTI HIT-HY 150 MAX
5. 作業基準：KINETのリボルト作業基準に準拠し行う
6. 連絡先：kinet2008koho@yahoo.co.jp
7. 作業手順：現終了点またはその上部にアンカー支点を設け別紙ビレー要領図に従い安全確保の上作業を行う
8. クレーム等：クライマーから問い合わせ・クレームがあった時は即刻中止して問題解決を行う事とします
9. 諸注意とお願い：当日クライミングをされます方にはご迷惑をお掛けする事もあろうかと思えます。ご協力、ご理解をよろしくお願いいたします。
整備された支点は、月曜日までは使わないでください。ケミカル接着剤が完全に固まるのに時間がかかります。ルート整備は、最新の技術と資材で行っていますが、支点の安全性を100%保障するものではありません。
クライミングにおいては、あくまで、各自、自己責任で支点や終了点の信頼性の確認を含め、行ってください。
10. 初登者の承諾：2012年8月29日に承諾取得済み


以上

ルート図 (ROCK&SNOW Chronicle より転用)

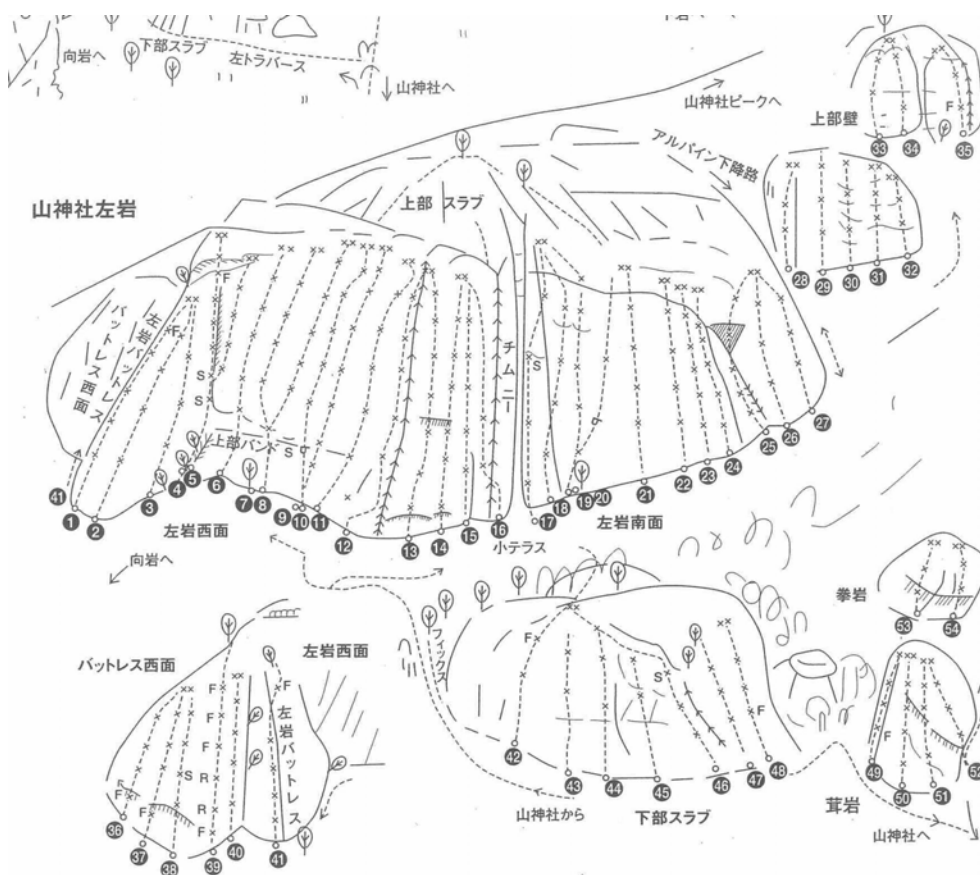

ビレー要領図

7ピットまたは8ピットで終了点に固定 安付ピット複数使用

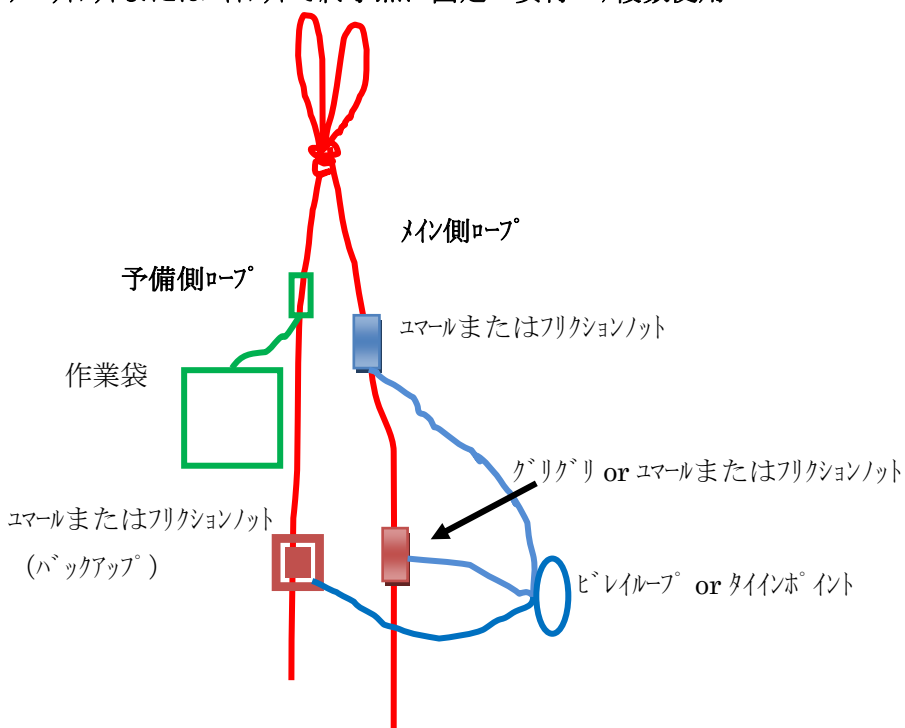

現状終了点写真
作業エリア3の終了点



作業エリア2の終了点



紺碧の宇宙へ

作業エリア1の終了点

